

新北市政府養護工程處
《土城區城市綠廊縫合暨再生光野營造工程》

樹木移植計畫書
第2版

主辦機關：新北市政府養護工程處

監造單位：和泰工程顧問股份有限公司

施工單位：鴻廣營造有限公司

新北市景觀樹木修剪技術合格證：

姓名	合格證號	有效期限
曹	1140918025	117/09/18

1 1 5 年 8 月

目 錄

壹、 移植樹木.....	1
貳、 移植目的.....	1
參、 施工日期(含修剪、斷根、移植及定植).....	4
肆、 遷移地點(地段、所有權人及維護管理等相關資料單位必填).....	5
伍、 移植方法.....	8
陸、 申請者(工程主辦單位及施工單位).....	15
柒、 份數.....	15
捌、 附件.....	16

壹、移植樹木

本案移植樹木2株臺灣欒樹 *Koelreuteria henryi*，胸高直徑 (D.B.H.) 分別為44.5及42cm。調查基本資料如下表所示(現場照片詳附件1)。

表1 本案移植樹木基本資料表

項次	編號	樹種	胸徑(公分)	樹高(公尺)	所在地號
1	10	臺灣欒樹	44.5	8	板橋所 (FA0195) 樂利段 764地號
2	11	臺灣欒樹	42	8	板橋所 (FA0195) 樂利段 764地號
		(以下空白)			
合計			共2株		

貳、移植目的

本案為新北市養工處公有土地活化新建公園，本案有2株臺灣欒樹之需求，透過本市公有地樹木媒合資訊得知本工區鄰近的新北市土城區樂利國小操場有適合本案需求之樹種；移植樹木位於校內新建光電球場範圍，與球場頂棚及柱位重疊(如圖2所示)，擬配合本工程施工期間辦理媒合移植。



圖1 本案移植樹木現況區位圖

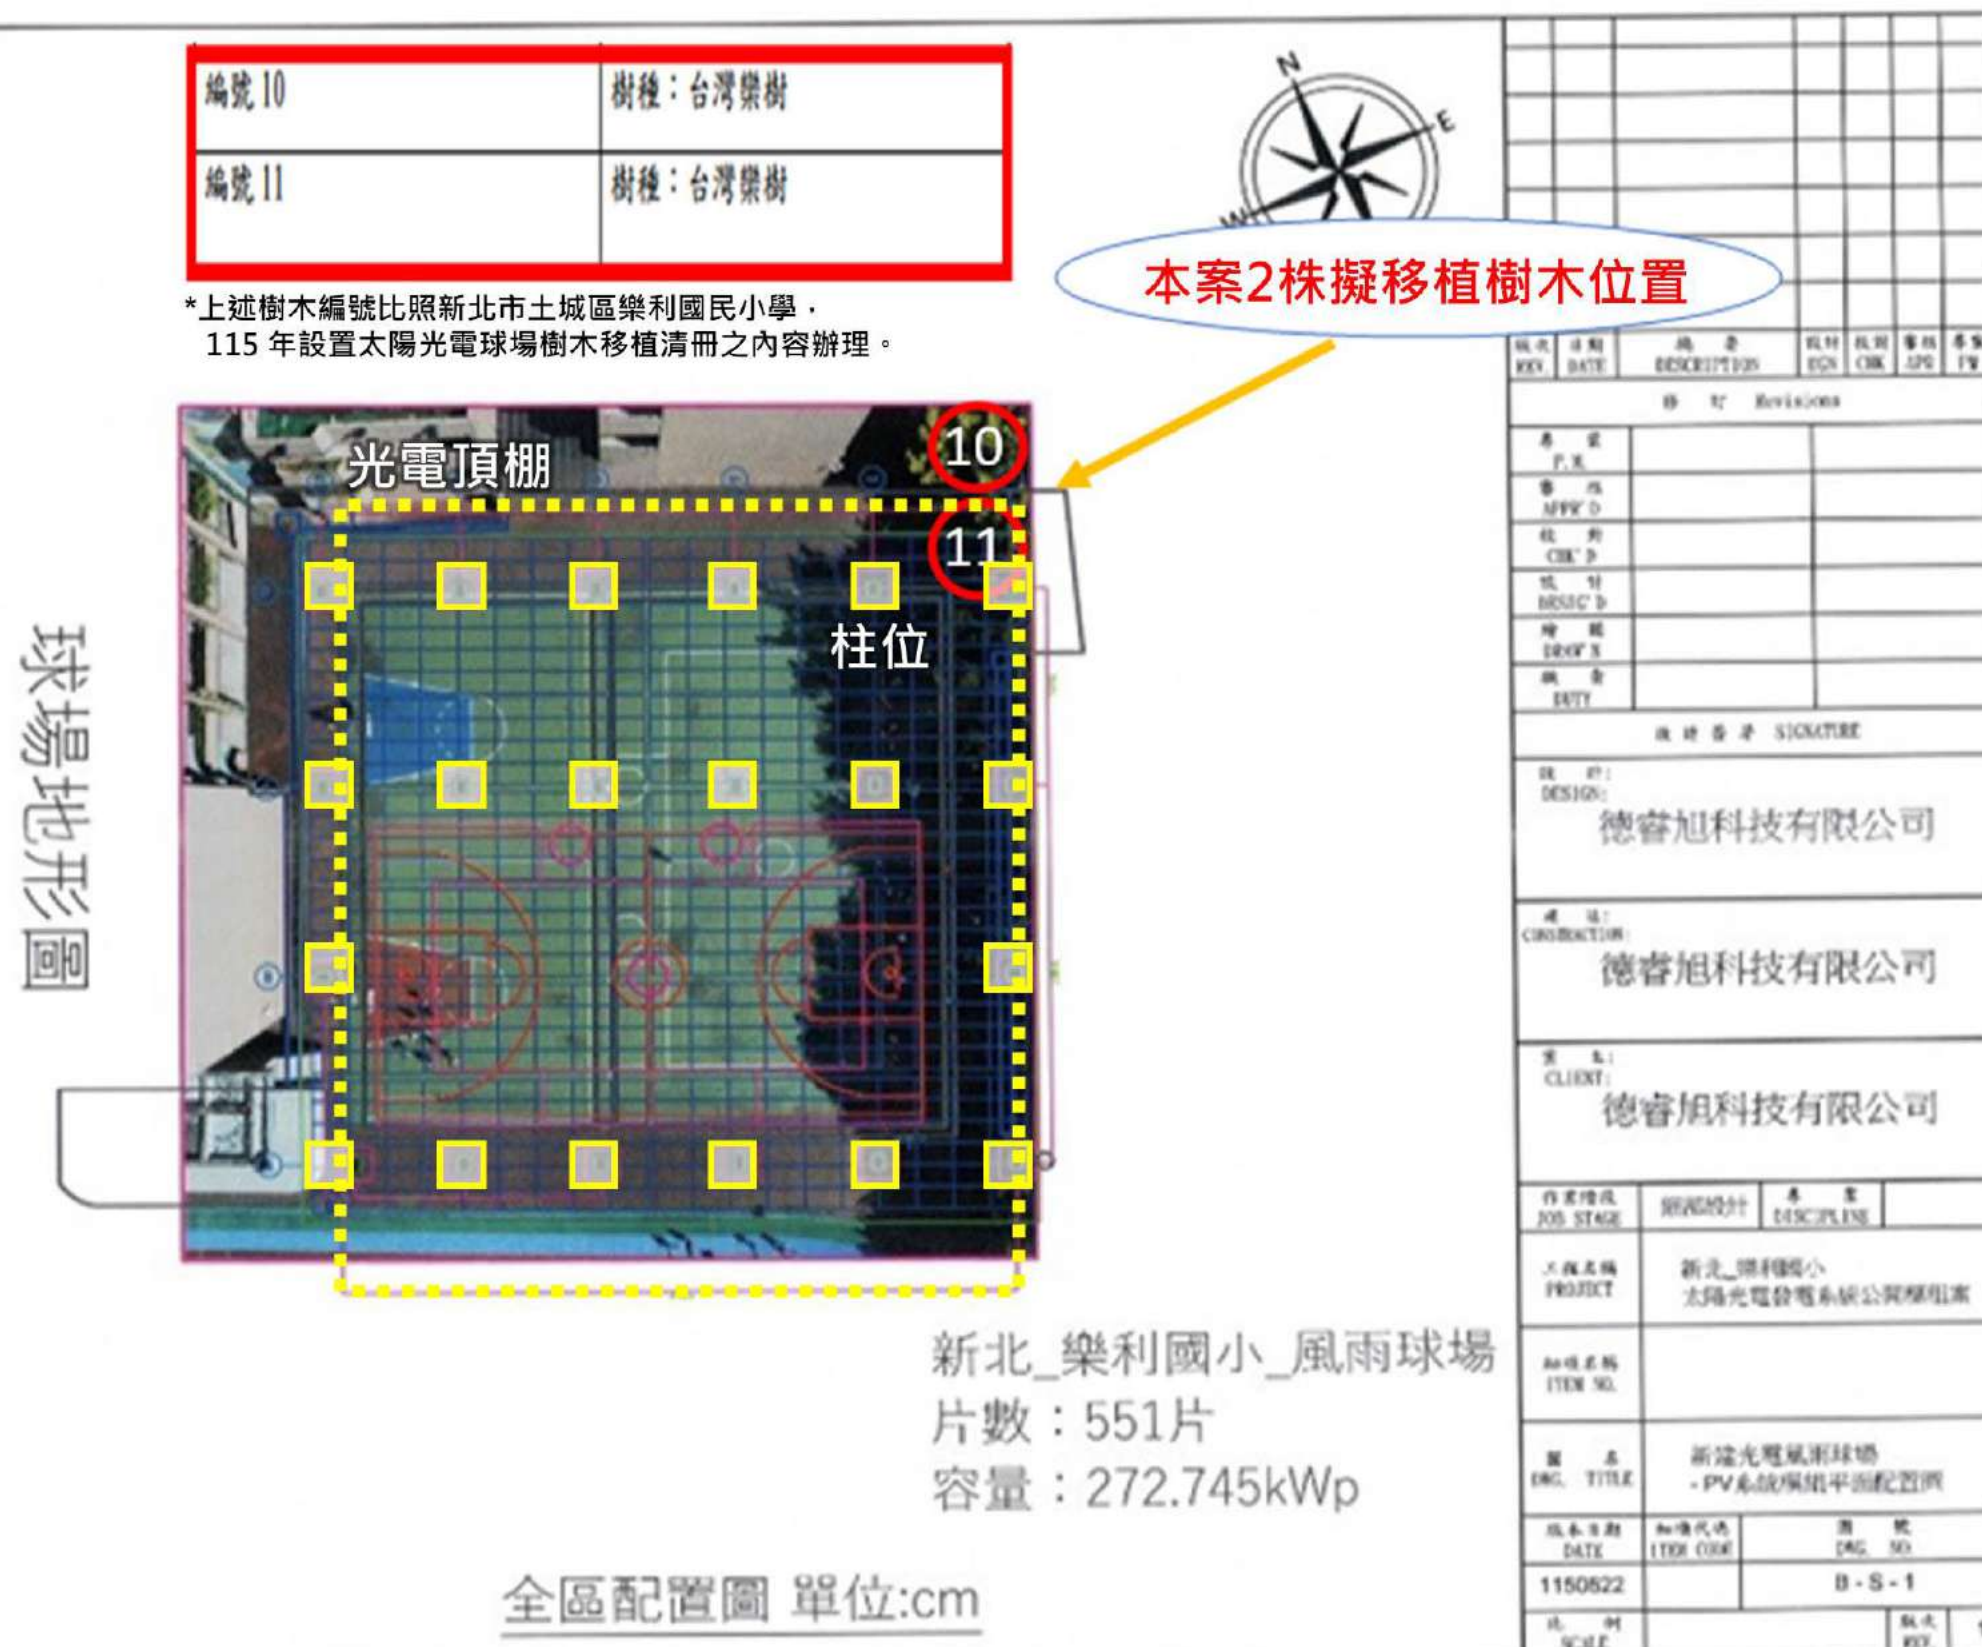


圖2 移植樹木區位及光電球場全區配置圖

(附件 土地所有權人移植同意書)

土地所有權人移植同意書

立同意書人：新北市土城區樂利國民小學

地號：新北市土城區樂利段 764 地號

立同意書人茲同意本筆土地上 2 株樹木辦理移植工程，並配合新北市政府養護工程處「土城區城市綠廊縫合暨再生光野營造工程」之公有土地活化新建公園需求，於樹木生長土地範圍進行施工行為。請貴單位按新北市樹木保護自治條例第十三條，檢送後續樹木移植計畫之相關事宜。

土地所有權/管理人：新北市土城區樂利國民小學



中 華 民 國 115 年 8 月 12 日

圖3 土地所有權人之移植同意書

本次移植作業旨在避免樹木遭砍除破壞，將透過專業移植技術將樹木重新定植至鄰近適宜環境，藉此改善生育地環境，以落實生態保育與永續利用之目標，並兼顧公共設施之建設需求。



編號 1	樹種：榕樹
編號 2	樹種：榕樹
編號 3	樹種：榕樹
編號 4	樹種：榕樹
編號 5	樹種：榕樹
編號 6	樹種：榕樹
編號 7	樹種：榕樹
編號 8	樹種：榕樹
編號 9	樹種：榕樹
編號 10	樹種：台灣欒樹
編號 11	樹種：台灣欒樹

圖4 本案移植樹木清冊資料

參、施工日期(含修剪、斷根、移植及定植)

本工程於115年4月3日開工，將俟移植計畫書核准後辦理，施工前14日將設置公告，且將通知土城區公所至現地督導並副知農業局。

此外，評估本次移植樹木位於植栽帶內，周邊為硬鋪面，整體根系集中且生長勢良好，移植與定植兩者地點屬短距離移植。

本案因應工程進度規劃，移植準備期程無法依一般規範進行完整斷根養護作業，評估作業期程如下表2。

表2 移植作業施工日期規劃

項目	日期規劃		工作天數(日)
	起	迄	
樹木調查評估	115/6/1	115/6/5	5
施工前公告			14
修剪			2
斷根			1
移植			1
定植			1

肆、遷移地點(地段、所有權人及維護管理等相關資料單位必填)

本次2株移植樹木所在地位於樂利段 764地號，現址為樂利國小操場周邊綠地範圍，如下圖所示。

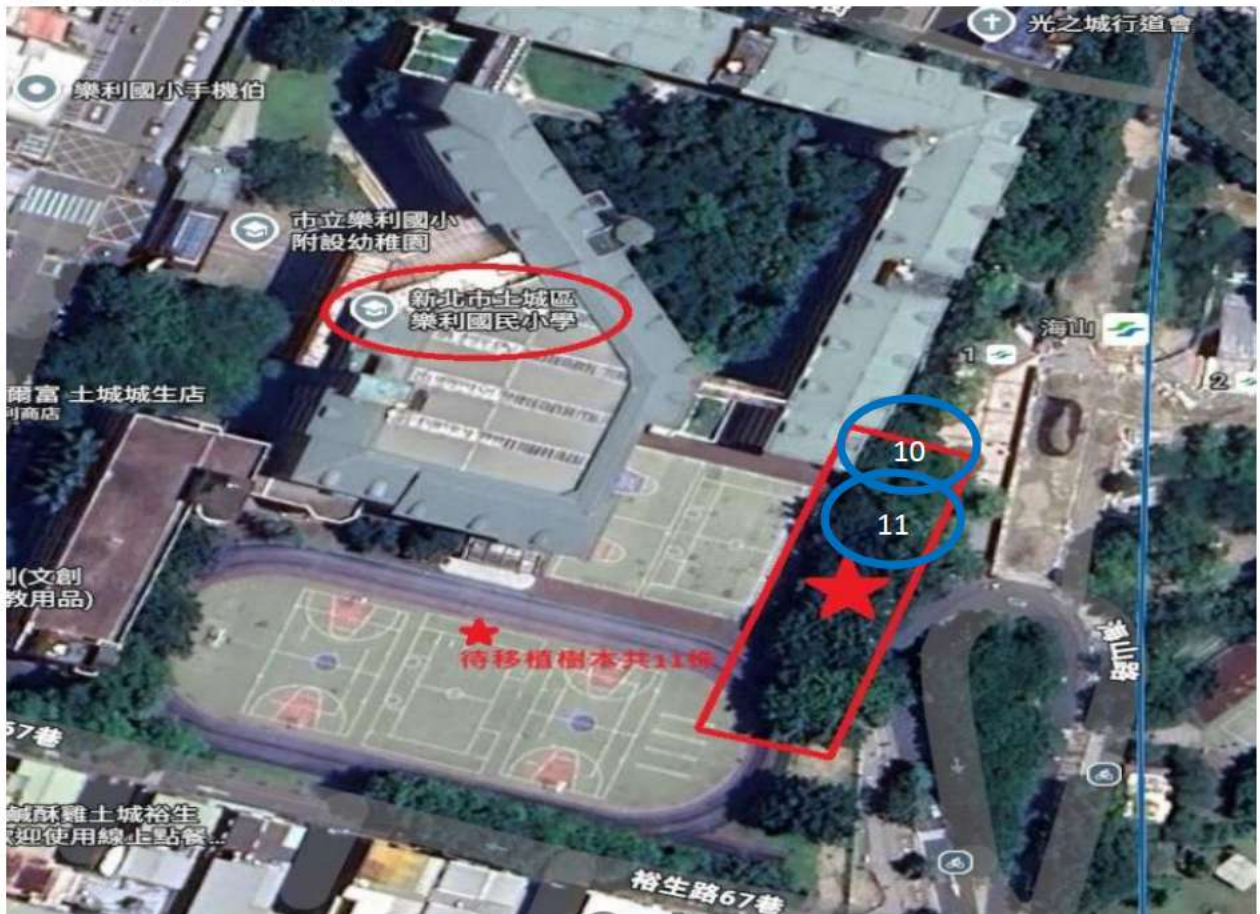


圖5 待移植樹木地點區位示意圖

移植地點屬公有地之公有樹木，該土地所有權人及管理單位為新北市土城區樂利國民小學，本計畫範圍土地基本資訊如下。

土地資訊		公有土地所有權人資料	
面積	8515.98 平方公尺	登記日期	
使用分區		登記原因	(空白)
使用地類別		所有權人	新北市
登記日期	民國093年10月30日	統一編號	0006500000
公告土地現值	183000 元/平方公尺	所有權人類別	直轄市有
權利人類別	省市:100.00%	權利範圍類別	全部
本查詢資料有時間落差，實際應以地政事務所地籍資料庫記載為準。		權利範圍持分分母	1
		權利範圍持分分子	1
		申報地價	33800 元/平方公尺
		管理者名稱	新北市土城區樂利國民小學

圖6 待移植樹木地點土地基本資訊

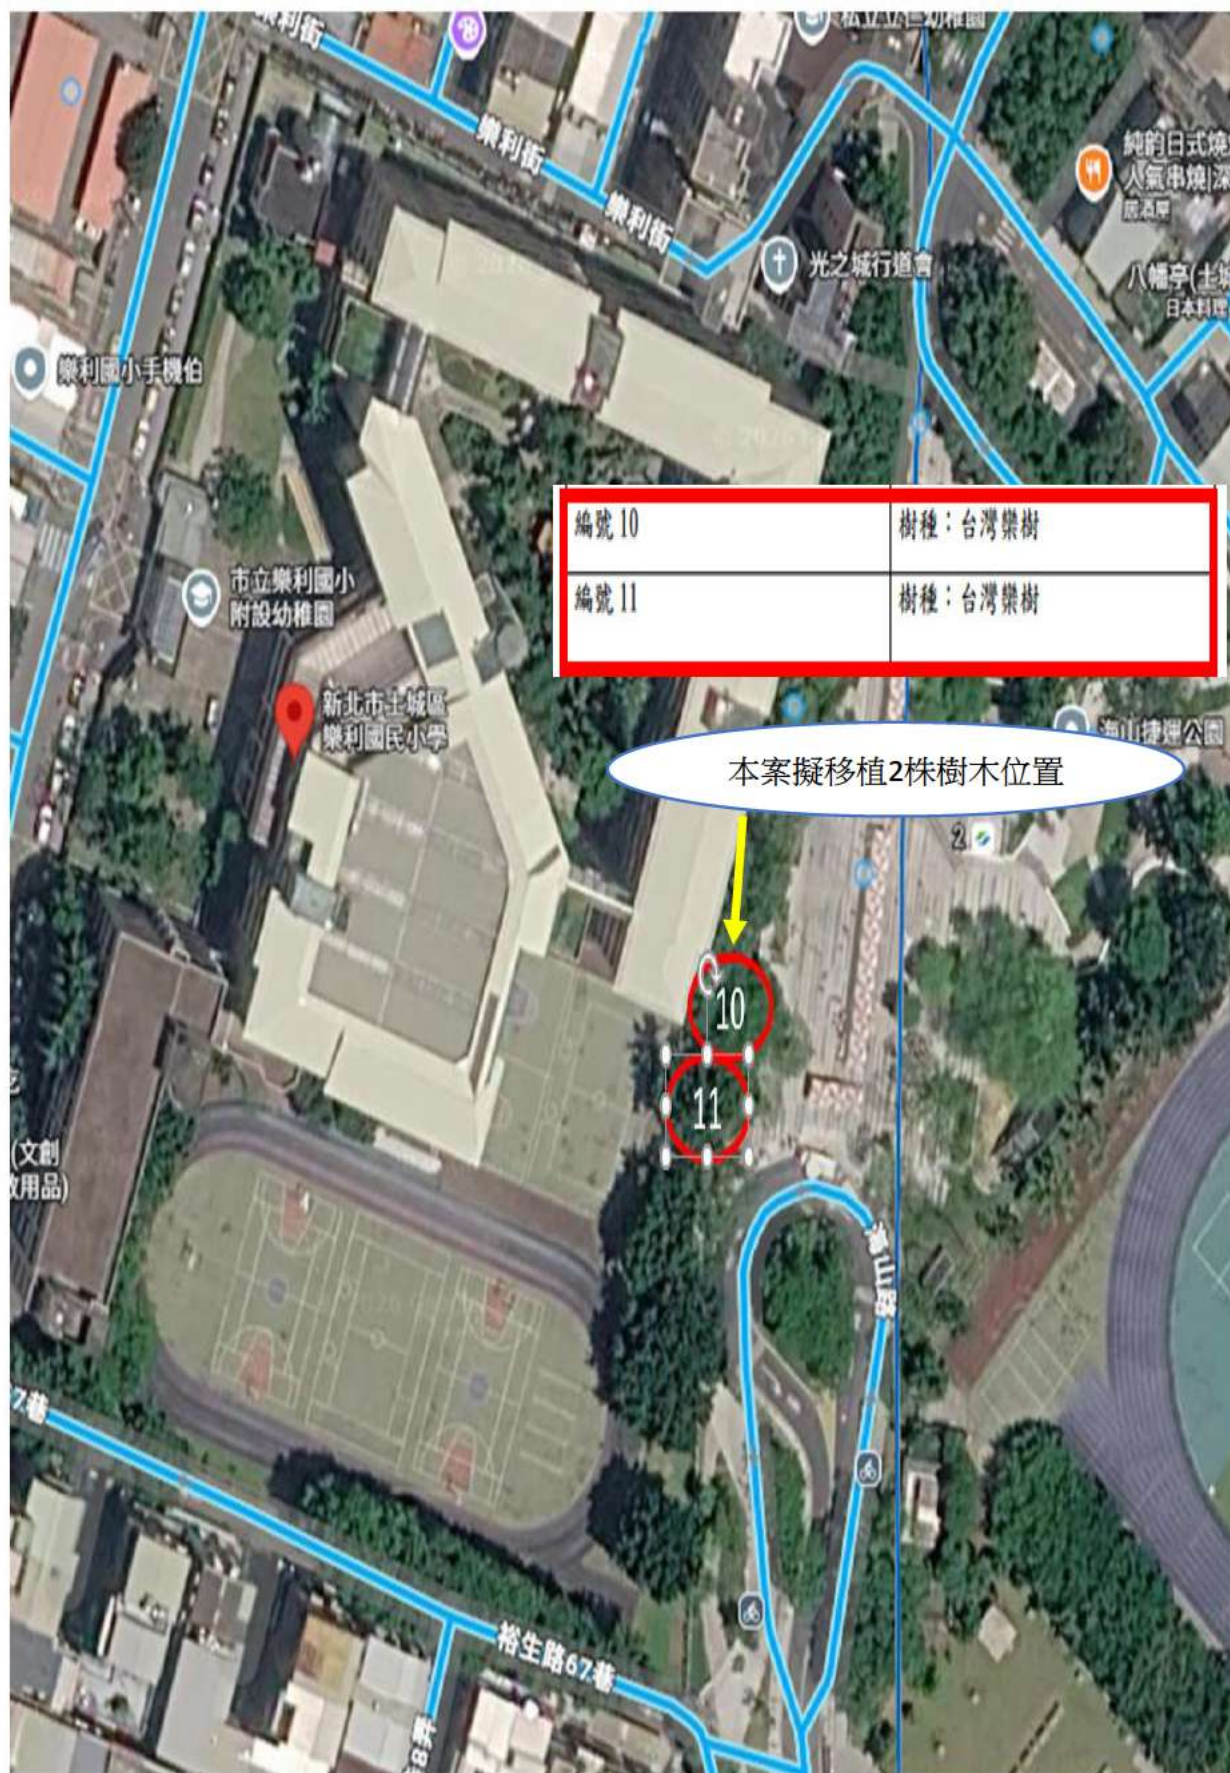


圖7 本案擬移植樹木編號及位置圖

定植地點位於員和段 52地號，如下圖所示。



圖8 樹木定植地點區位示意圖

定植地點該土地所有權人及管理單位為新北市政府養護工程處，本計畫範圍土地基本資訊如下。

行政區	段小段	地建別	地建號	地圖	面積(平方公尺)	使用分區	使用地類別	容許使用項目	公告現值(元/平方公尺)	公告地價(元/平方公尺)	公私有類別	三七五租約註記
土城區	興和段	土地	0052 - 0000		200.95				174,434	31,337	公有	否

土地資訊	
面積	150.74 平方公尺
使用分區	
使用地類別	
登記日期	民國109年06月08日
公告土地現值	233000 元/平方公尺
權利人類別	省市:100.00%
本查詢資料有時間落差，實際應以地政事務所地籍資料庫記載為準。	

圖9 樹木定植地點土地基本資訊

陸、申請者(工程主辦單位及施工單位)

- 一、 移植現況檢核表(詳附件5)。
- 二、 檢附證明文件(詳附件6)：本案以公司名義申請。
 - (一)以個人名義申請：檢附身份證影本。
 - (二)以公司名義申請：檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件。
- 三、 施工單位檢附切結書(詳附件7)。
- 四、 修剪作業人員檢附切結書(詳附件8)。

柒、份數

本移植計畫書應提送一式5份與光碟1份，於核准後，分別保管者如下：

- 一、 2份計畫書與1份光碟交新北市政府農業局保管。
- 二、 1份交移出地區公所保管。
- 三、 1份交移入地區公所保管(如移入地點涉及不同行政區時，請配合增加份數)。
- 四、 1份核定後交還申請人保管備查。

捌、附件

(附件1移植樹木現場照片)

	
樹種：台灣欒樹	
規格：胸徑：44.5公分，高度8公尺。	
移植原因：因新建公園需求，透過樹木媒合平台，尋到樂利國小因光電球場興建，有樹木生長狀況良好的樹木帶移植，恰巧品種跟狀況符合公園興建條件，故申請同意移植至本公園。	

	
樹種：台灣欒樹	
規格：胸徑：42公分，高度：8公尺。	
移植原因：因新建公園需求，透過樹木媒合平台，尋到樂利國小因光電球場興建，有樹木生長狀況良好的樹木帶移植，恰巧品種跟狀況符合公園興建條件，故申請同意移植至本公園。	



註1：現場照片須拍攝整體植株現況。

註2：胸徑係指離地高度1.3公尺處之樹幹直徑

(附件2遷移地點現場照片)



註1：移植間距5至10公尺，視情況調整。

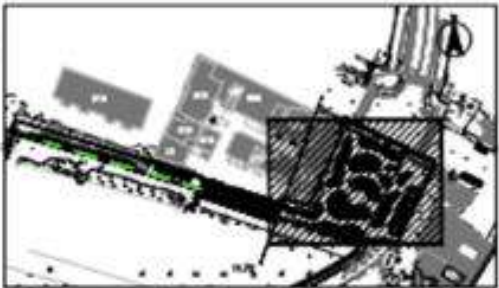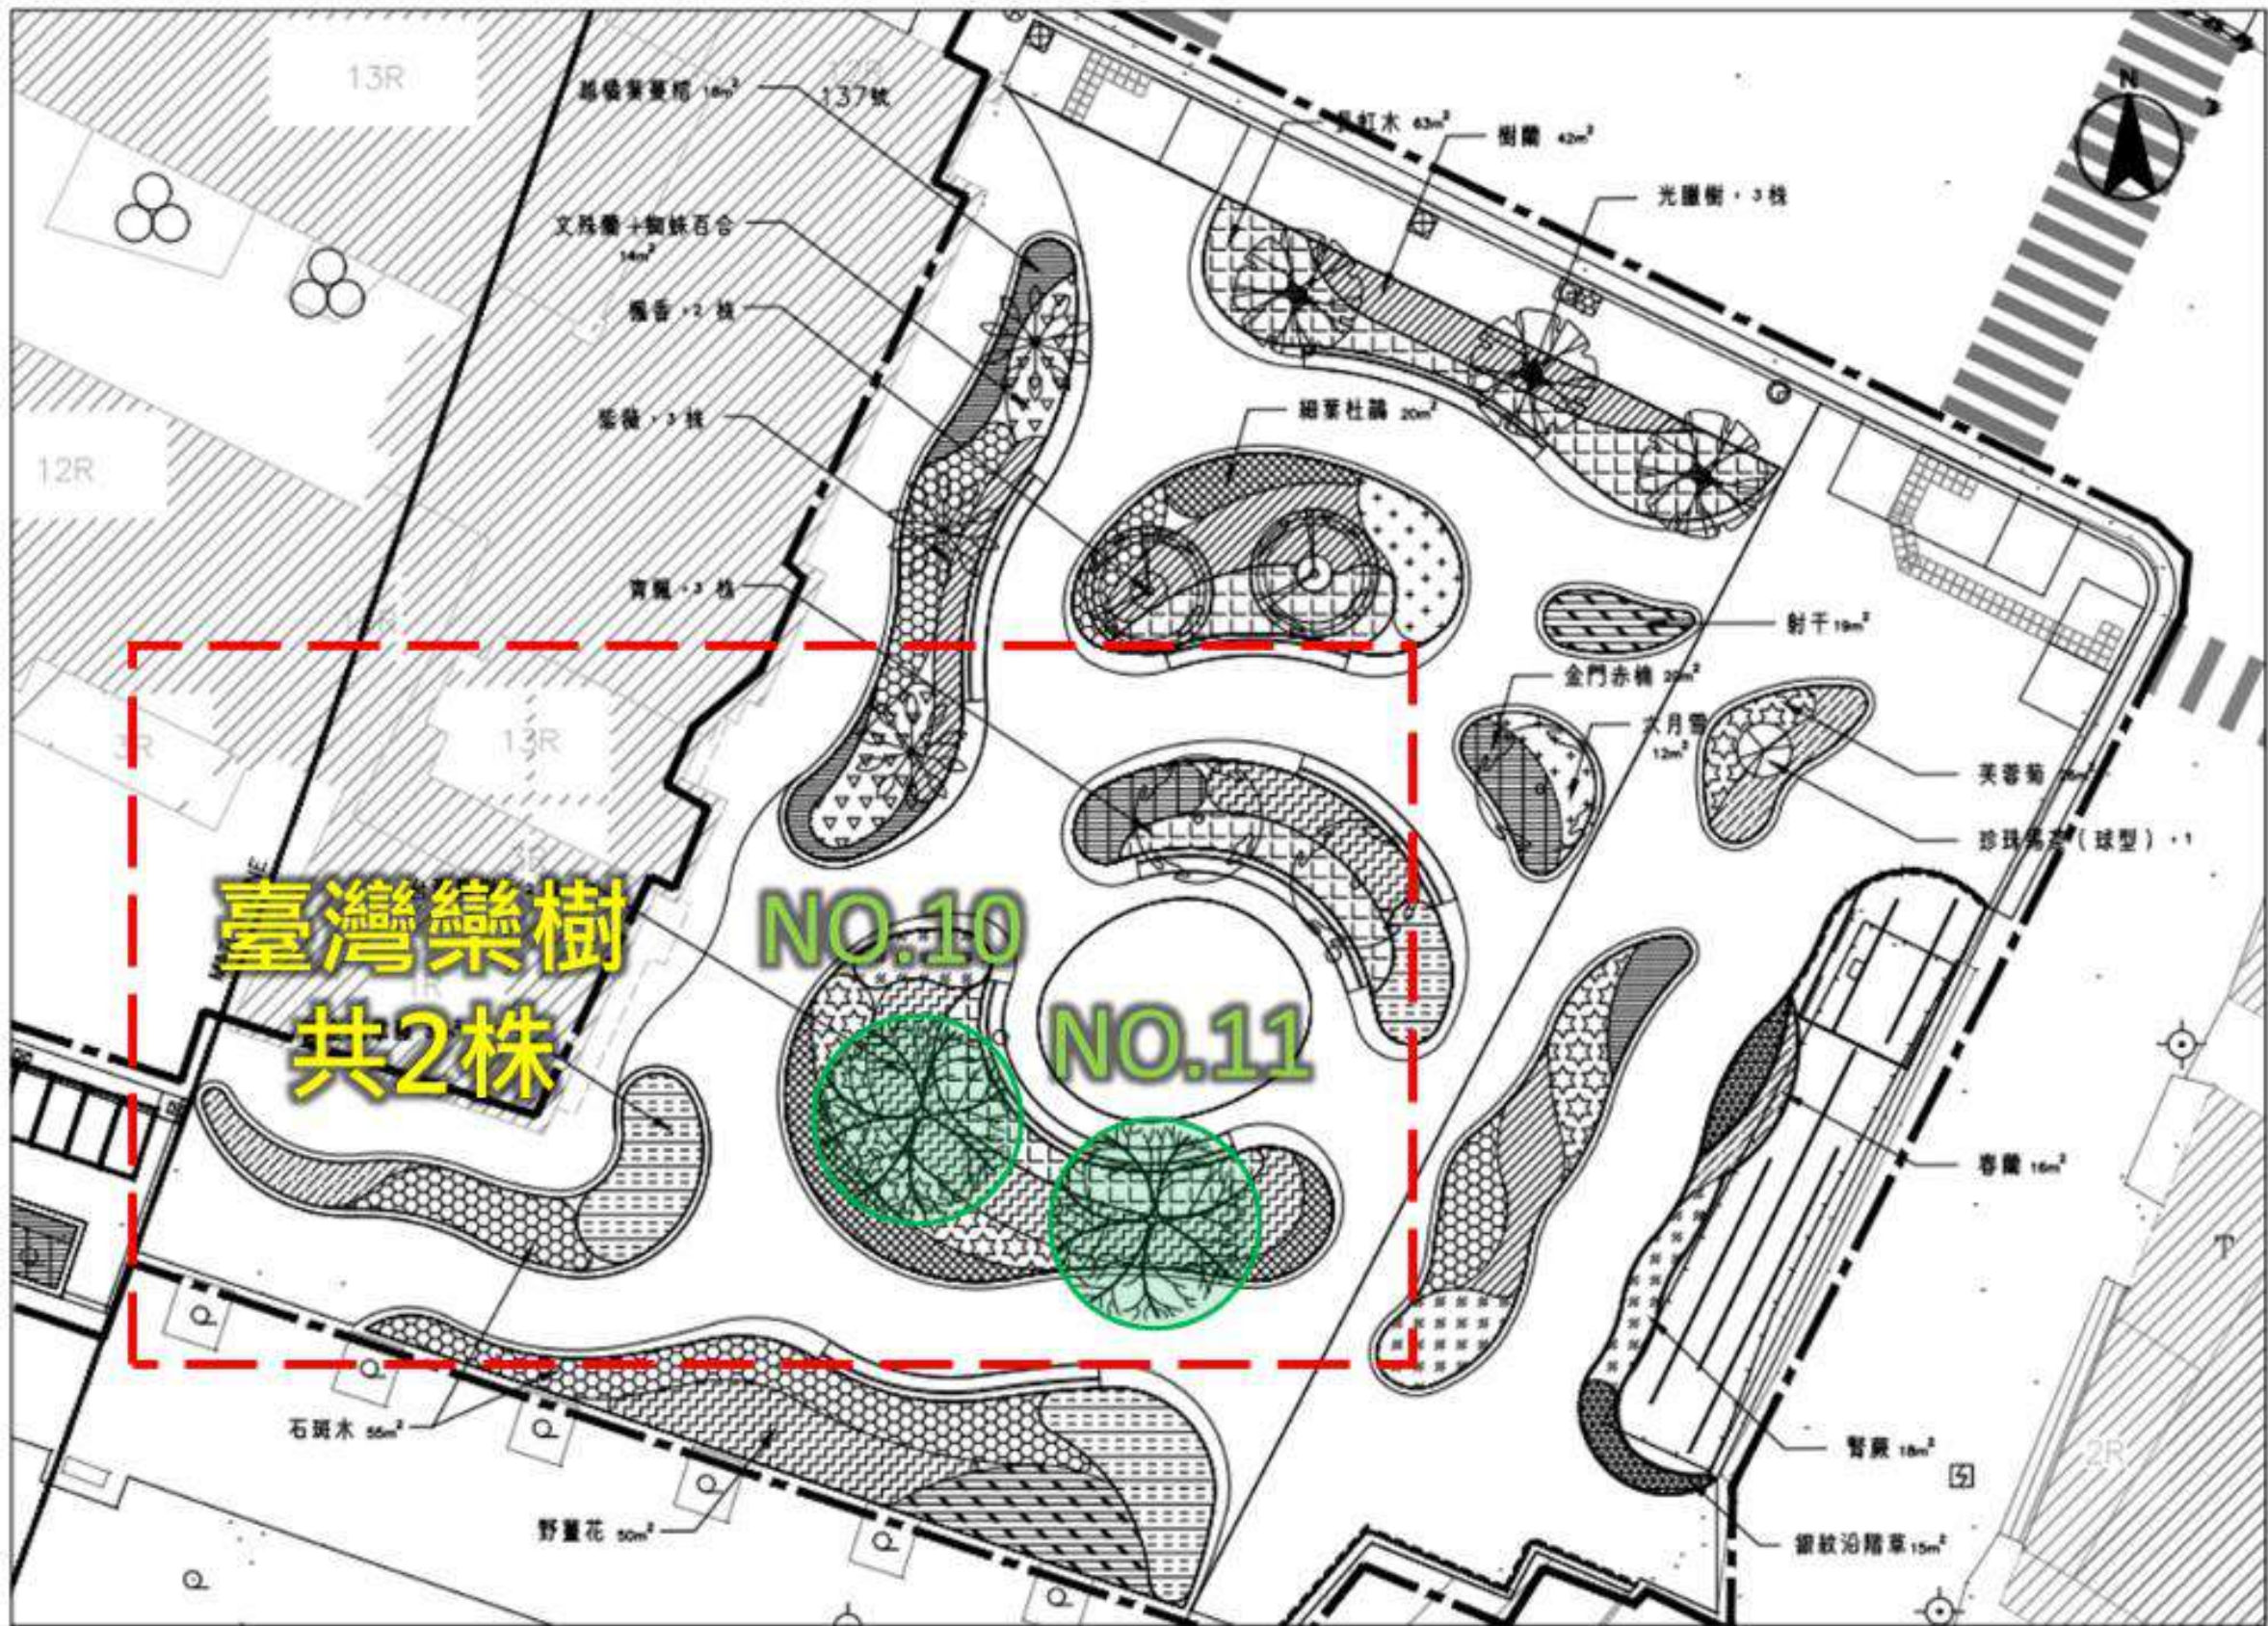

索引圖

圖例	名稱	數量
	工程範圍	2097.5m ²
	台灣樂樹 (複合移植)	2 株
	青楓 <i>Acer serrulatum</i>	3 株
	光臘樹 <i>Fraxinus griffithii</i>	3 株
	紫薇 <i>Lagerstroemia micrantha</i>	3 株
	楓香 <i>Liquidambar formosana</i>	2 株
	珍珠馬茶 (球型) W<50cm	1 株
	越橘葉蔓榕 W<15cm	64 株 16m ² /m ² 1024株
	香蘭 H<25cm, W<20cm	25 株 16m ² /m ² 450株
	香蘭 H<25cm, W<20cm	25 株 16m ² /m ² 400株
	銀紋沿階草 H<20cm, W<15cm	36 株 15m ² /m ² 540株
	射干 H<25cm, W<20cm	49 株 19m ² /m ² 931株
	野薑花 H<25cm, W<20cm	25 株 50m ² /m ² 1250株
	文殊蘭+蜘蛛百合 H<35cm, W<30cm	36 株 14m ² /m ² 504株
	樹蘭 H<35cm, W<30cm	25 株 42m ² /m ² 1050株
	長虹木 H<60cm, W<35cm	25 株 63m ² /m ² 1575株
	細葉杜鵑 H<25cm, W<20cm	25 株 20m ² /m ² 500株
	金門赤楠 H<25cm, W<20cm	25 株 20m ² /m ² 500株
	六月雪 H<25cm, W<20cm	25 株 12m ² /m ² 300株
	芙蓉菊 H<25cm, W<20cm	36 株 26m ² /m ² 936株
	石斑木 H<25cm, W<20cm	25 株 55m ² /m ² 1375株
	黃金錦掌藤 H<30cm, W<25cm	25 株 33m ² /m ² 825株

說明：

1. 植栽種植詳細圖說，詳 TR-004。
2. 施作位置可依現況調整，數量依實作計價。
3. 考量植栽非一般訂製品，若因應施作季節及市場供給，經工程司同意後可作適度調整。

植栽配置圖

(A3) S=1:200 Unit: M

(附件3識別牌)

編號	10	樹種	臺灣欒樹
規格	胸徑：44.5公分；高度：8公尺		
工程名稱	土城區城市 綠廊縫合 暨再生光野 營造工程	案號*	1150213C
工程主辦單位	新北市政府 養護工程處	電話	(02) 2225-3299
施工單位	鴻廣營造 有限公司	電話	(02) 2498-0230
陳情專線	移出地 新北市 土城區公所	電話	(02) 2273-2000
	移入地 新北市 土城區公所	電話	(02) 2273-2000
核准日期	○○年○○月○○日		
移植日期	○○年○○月○○日(請確實填寫)		
移植狀況			

(附件6 證明文件)

一、以公司名義申請(公司登記證明文件或商業登記證明文件)

依「公司登記電子申請及電子送達實施辦法」第10條規定，主管機關應送達公司或其代理人之公文，得以轉存於電子公文下載平台「**電子送達**」之電子公文及其附件代之，其與紙本公文送達有同一效力。

共 2 頁 第 1 頁

有限公司變更登記表

(公司印章) (代表公司負責人印章)





變更預查編號 6 9 7 4 0 1 7 8

公司統一編號 6 9 7 4 0 1 7 8

公司聯絡電話 ()

僑外投資事業 是 ☒ 否 一人公司 是 ☒ 否

陸資 是 ☒ 否

原名稱 有限公司

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

一、公司名稱	中文	鴻廣營造		有限公司
(變更後)	(章程所訂) 外文			
√ 二、(郵遞區號)公司所在地 (含鄉鎮市區村里)	(252) 新北市三芝區埔坪里中正路一段84巷2弄33號(1樓)			
三、資 本 總 額	新台幣	12,000,000 元(阿拉伯數字)		
四、董 事 人 數	1 人	√ 五、代表人姓名	張克溢	
√ 六、公司章程修正(訂定)日期	114 年 05 月 23 日			
七、本次資本增加明細 (若資本為0者，請加填第九欄位)	資產增加	1. 現金	元	
		2. 財產	元	
		3. 技術	元	
	權益科目調整	4. 資本公積	元	
		5. 法定盈餘公積	元	
		6. 股息及紅利	元	
	併購	7. 合併	元	
	其他	8. 債權抵繳股款	元	
八、本次資本減少明細	1. 彌補虧損	元	2. 退還出資額	元
九、 被合併 公司資 料明細	合併基準日	統一編號	公司名稱	
	年 月 日			
	年 月 日			

※變更登記
日期文號

1148040032

※
編號

公務記載蓋章欄



(一)申請表一式二份，於複聯後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
 (二)為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。
 (三)如各欄如變更登記日期文號、權號等，申請人請勿填寫。
 (四)違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
 (五)為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。



廣告

新北市土城區樂利國小 114 年度
設置太陽光電發電系統公開標租案
樹木會勘紀錄

壹、地點：新北市土城區樂利國小

貳、時間：114 年 12 月 22 日 下午 16:00

參、出席單位：樹木保護委員會、新北市樂利國民小學、德睿旭科技有限
公司

肆、出席人員：詳如簽到表

單位	出席人員	簽名欄位
新北市樂利國民小學	陳良仁主任	陳良仁
新北市樂利國民小學	許嘉萍組長	許嘉萍
新北市樂利國民小學	程定中幹事	程定中
德睿旭科技有限公司	宋賢超	宋賢超
德睿旭科技有限公司	陳南樺	陳南樺
樹木保護委員會	許文燦委員	許文燦

伍、事由：研議新北市土城區樂利國小 114 年度設置太陽光電發電系統公開標租案樹木處理事宜

陸、報告事項：

- (一) 依據「新北市樹木保護自治條例」第 13 條及相關技術要領規定，樹木如因工程施工需遷移或修剪，應檢具計畫報請主管機關核准，並應先行邀請專家學者進行現地勘查及評估，以確保作業合法並兼顧植栽保育，爰本校依規定召開本次會勘會議。
- (二) 去年風災導致校園中兩處樹木倒塌，經檢查發現是褐根病導致樹根脆弱。
- (三) 114 年度設置太陽光電發電系統公開標租案中，欲設置光電球場的位置旁，現有數棵樹木，考量樹木生長權利及校園安全，邀請樹保專家評估影響。

柒、討論事項與決議：

- (一) 操場跑道南側之樹木，緊鄰學校圍牆及校外民生住宅，因該處有電線桿，為免影響電線曾數次修剪，經長期日照及修剪影響，樹形不對稱且向校園傾斜，建議矮化，以利校園及附近住宅安全。
- (二) 綜合球場旁，部分樹木因近年受風災影響、生長受限、樹況不佳、樹形結構不穩定等，恐有安全疑慮，建議申請移除。

以下為建議移除之樹木現況說明(見下列附圖)：

- 1. 樹木編號 1：樹幹與根部腐爛。
 - 2. 樹木編號 4：樹形結構不佳，有安全疑慮。
 - 3. 樹木編號 5：樹幹與根部腐爛。
 - 4. 樹木編號 10：樹種共生且有腐爛現象。
 - 5. 樹木編號 13：樹種共生且有腐爛現象。
 - 6. 樹木編號 15：樹形結構不佳，有安全疑慮。
- (三) 其他樹勢健康，因建置風雨球場，考量未來生長恐受限制，且有柱位干涉疑慮，建議另覓地點移植。



校園南側樹木，緊鄰學校圍牆及校外民宅，現況樹形不對稱且向校園傾斜，建議矮化。




本次會勘 17 棵樹木之標示，其中：

1. 樹幹與根部腐爛：編號 1、編號 5
2. 樹種共生且有腐爛現象：編號 10、編號 13
3. 樹形結構不佳有安全疑慮：編號 4、編號 15

總計 6 顆建議移除(各棵詳細照見下頁)，其餘如因建置風雨球場與柱位干涉，以移植方式處理。

編號 1

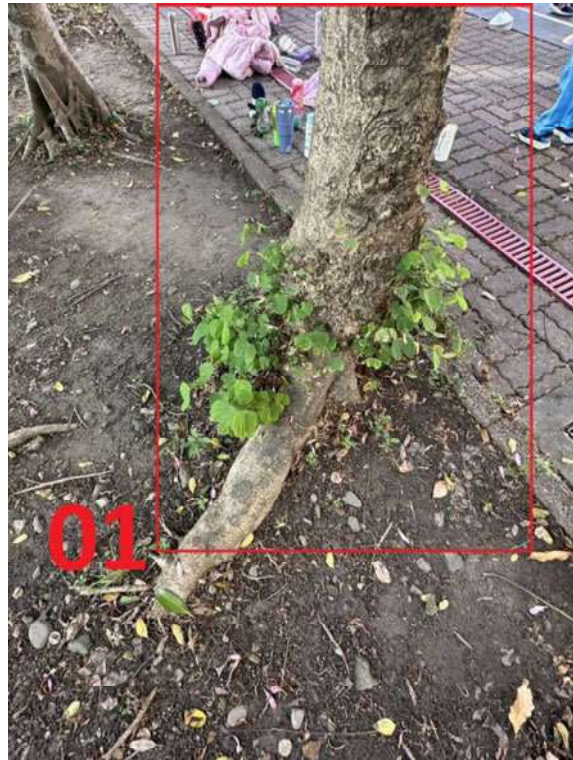

編號 4



編號 5



編號 10



編號 13



編號 15

